

Garantie-Abnahmeprotokoll

Fax: 04161/8003-10 Tel: 04161/8003-0



SH Kälte- & Kompressortechnik

Inbetriebnehmende Firma		Inbetriebnehmende Person	
		Inbetriebnahme Datum	
Aufstellungsort		Anwendung als zB. Wärmepumpe, Tieftemp., Klima usw.	
Komp. Hersteller	Komp. Typ	Komp. Serien Nr.	


Kältemittel: R.	Zylinderkopftemp.		Sauggasdruck		Sauggastemp.	
	Vollast 100 % °C	Teillast % °C	Vollast 100 % bar	Teillast % bar	Vollast 100 % °C	Teillast % °C

Verdichtungsendtemp.	
Vollast 100% °C	Teillast % °C

Verdichtungsenddruck	
Vollast 100% bar	Teillast % bar

Öldruck	
Vollast 100% bar	Teillast % bar

Kurbelgehäusetemp.	
Vollast 100% °C	Teillast % °C

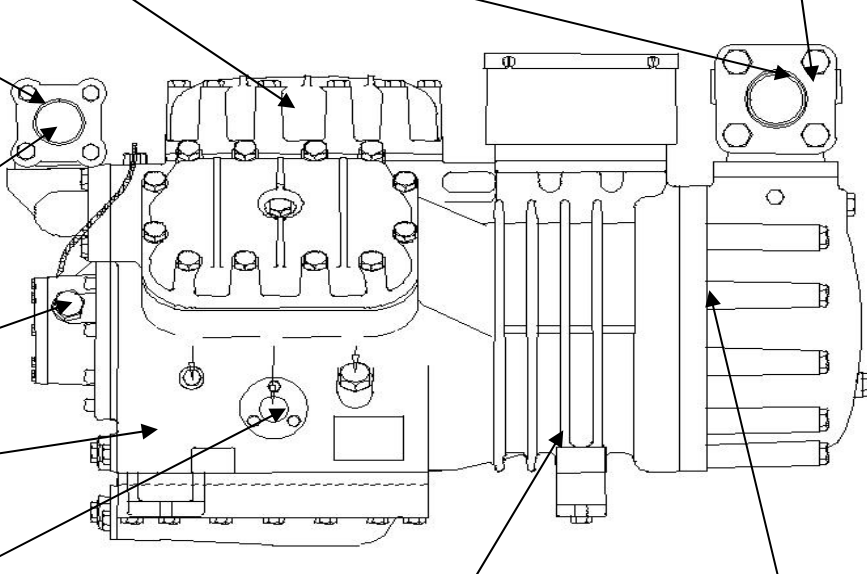

Füllstand Öl im Stillstand	
-----------------------------------	--

Ölwannenheizung Funktion	
JA	NEIN

Motortemp.	
Vollast 100 % °C	Teillast % °C

Motortemp.	
Vollast 100 % °C	Teillast % °C

Überhitzung	
Verdampfungstemp	°C
Temp. EXV Fühler	°C
Delta T	K

Spannung		Strom	
	Relais 1	Relais 2	
L1-L2			L1-L2
L2-L3			L2-L3
L3-L1			L3-L1

Temperatur Luft oder Wasser		Vollast od. Teillast		
Verflüssiger	Eingang	°C	Eingang	°C
	Ausgang	°C	Ausgang	°C

Säuretest durchgeführt:	JA	NEIN	Säure:	JA	NEIN
Ölwechsel:	JA	NEIN	Ölsorte:		
ACID-AWAY eingefüllt:			JA		NEIN
Leistungsschütze gewechselt:			JA		NEIN
Expansionsventil gewechselt:			JA		NEIN
